SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Subdivision V.R.D.

Aménagement de la Place Marcadieu

Quatrième Phase

Voie Est

Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries)
Durée des travaux : 3 semaines
du 17 Mars au 04 Avril 2014

Tranche 1 : du 17 au 28 Mars 2014

Construction du trottoir côté "Point Vert"

Tranche 2 : du 24 au 28 Mars 2014

Construction du stationnement côté place

Tranche 3 : du 31 Mars au 04 Avril 2014

Préparation des structures de chaussée et stationnement
Enrobés

Circulation et stationnement interdit pendant la durée des travaux .
Circulation rétablie le jeudi matin .
L'accés aux commerces et livraisons sera préservé .

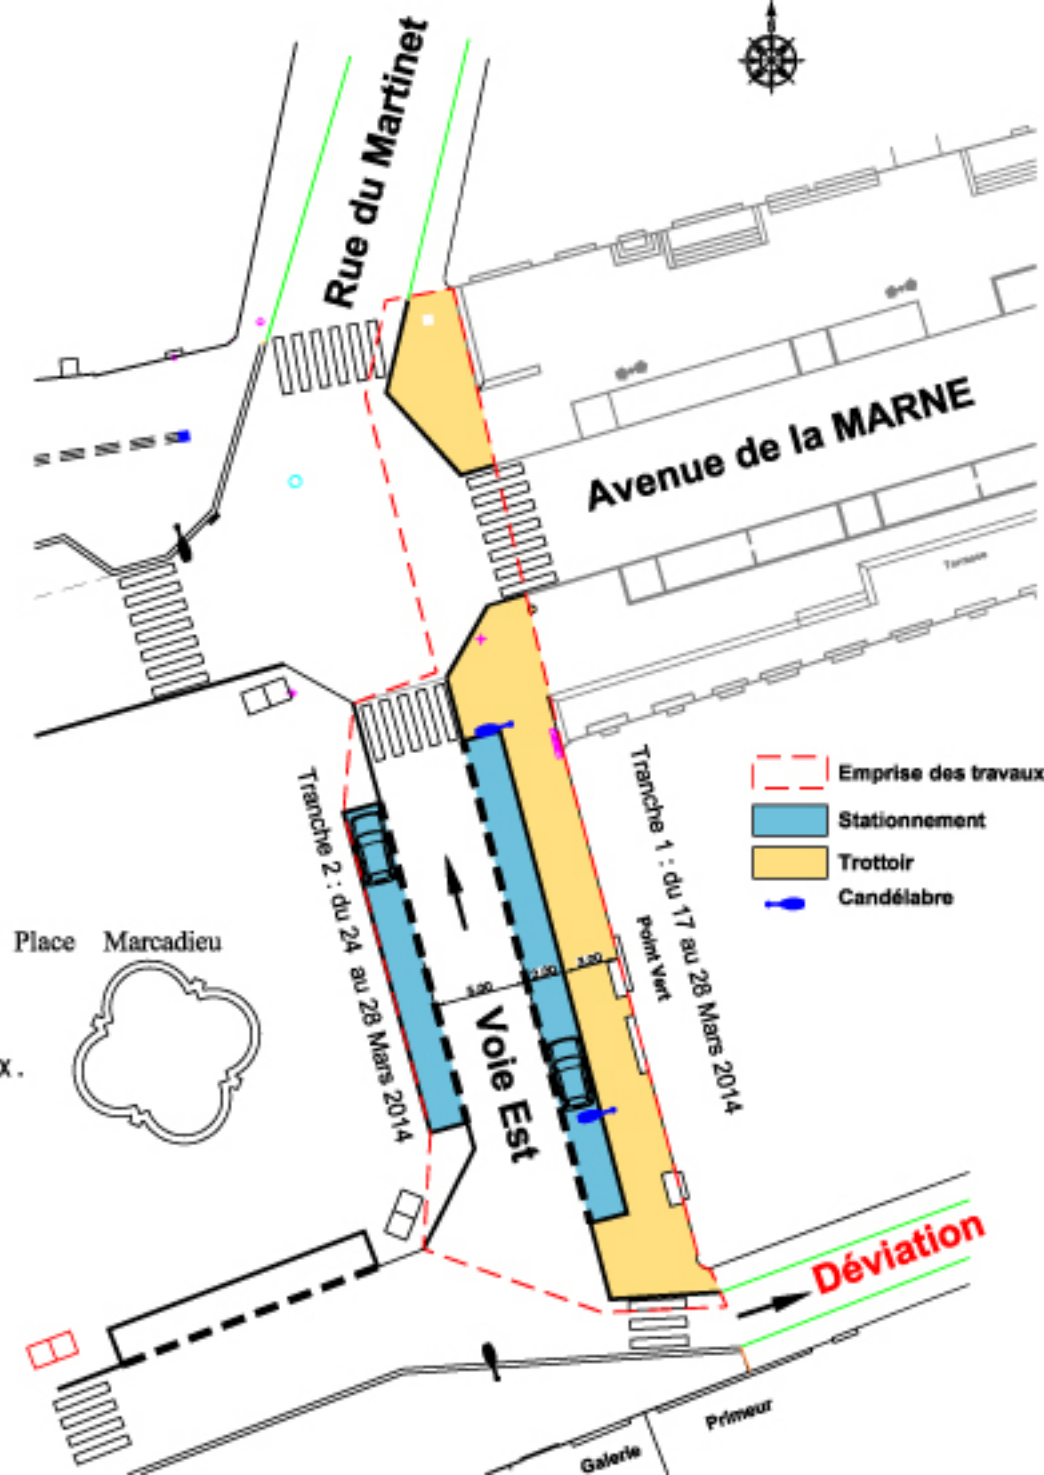

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Subdivision V.R.D.

Aménagement
Avenue de la MARNE

de la rue du Martinet au Quai Estevenet

Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries)

Travaux sur réseaux eau potale et assainissement : 2 semaines
du 17 Mars au 31 Mars 2014

Changement des branchements plomb
Réhabilitation du réseau des eaux usées

Travaux d'aménagement : 10 semaines
du 31 Mars au 06 Juin 2014

Phase 1 : du 31 Mars au 30 Mai 2014

Construction du trottoir Sud
de la Place Marcadieu au Quai Estevenet

Phase 2 : du 25 Avril au 30 Mai 2014

Construction du trottoir Nord

Phase 3 : du 02 au 06 Juin 2014

Préparation des structures de chaussée et stationnement
Enrobés

Le stationnement sera règlementé a l'avancement des travaux.
La circulation se fera sur une seule voie dans le sens Pont de la Marne vers le centre Ville.
Une déviation sera mise en place par la rue du Martinet.
La route sera barrée du 02 au 06 Juin 2014 .
Une déviation sera mise en place par la rue du Martinet - rue du Docteur Lansac
Le droit d'accès des riverains et des livraisons sera préservé.

Avenue de la MARNE

Profil en travers type



Légende

- Stationnement
- Trottoir
- Chaussée
- Plantation
- Candélabre
- Mât de fleurissement
- Muret parement en galets

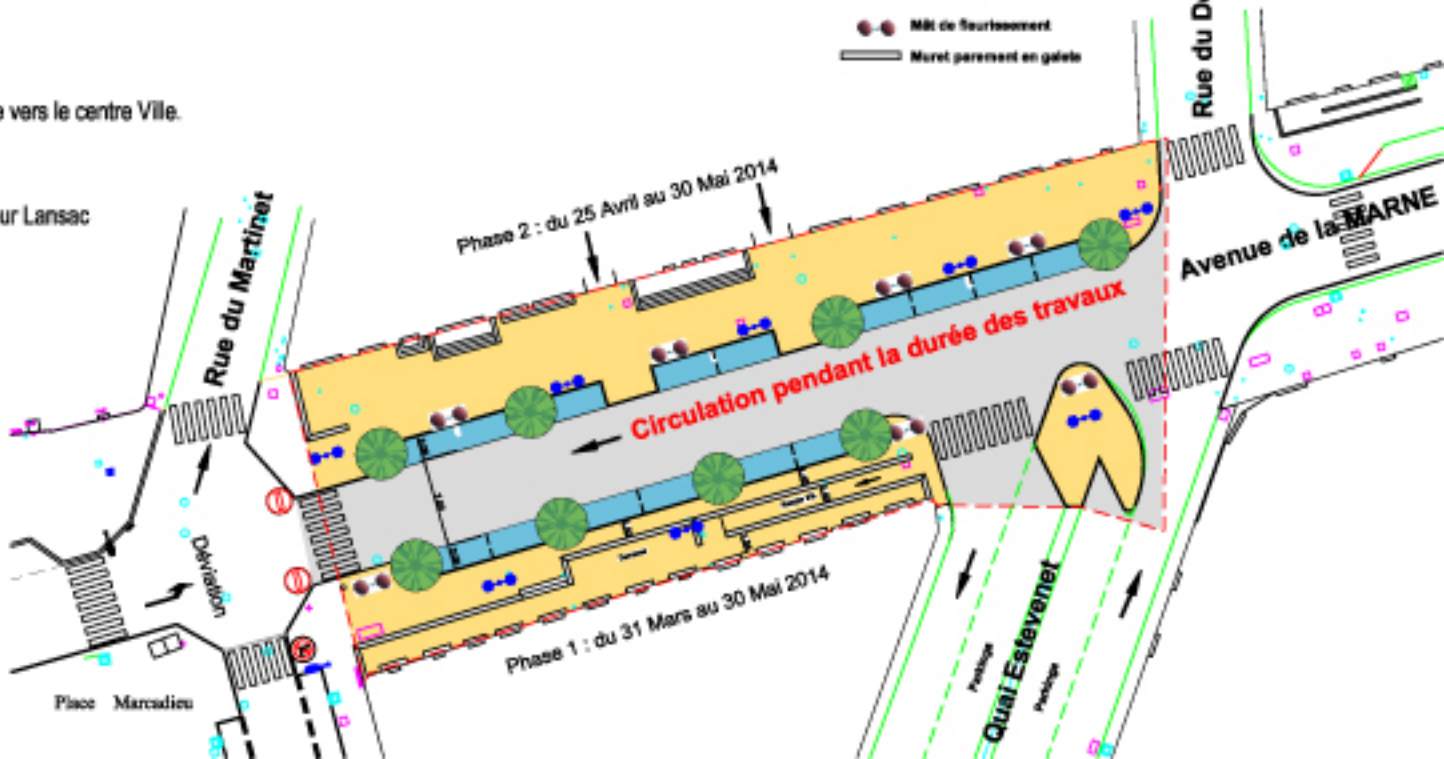

Aménagement du Quai Estevenet

Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries)

Durée des travaux : 12 semaines
du 17 Mars au 06 Juin 2014

Phase 1 : du 17 au 21 Mars 2014
Installation de chantier / Démolition / Désouchage d'arbres / Implantation

Phase 2 : du 24 Mars au 09 Avril 2014
Construction des réseaux éclairage public et du réseau pluvial

Phase 3 : du 03 Avril au 22 Avril 2014
Pose des bordures et caniveaux

Phase 4 : du 16 Avril au 02 Mai 2014
Pose des pavés et bandes de guidage

Phase 5 : du 30 Avril au 14 Mai 2014
Béton désactivé

Phase 6 : du 15 Mai au 23 Mai 2014
Applications des enrobés de trottoirs et chaussées

Phase 7 : du 26 au 30 Mai 2014
Pose du mobilier urbain

Phase 8 : du 02 au 06 Juin 2014
Finitions et nettoyage général.

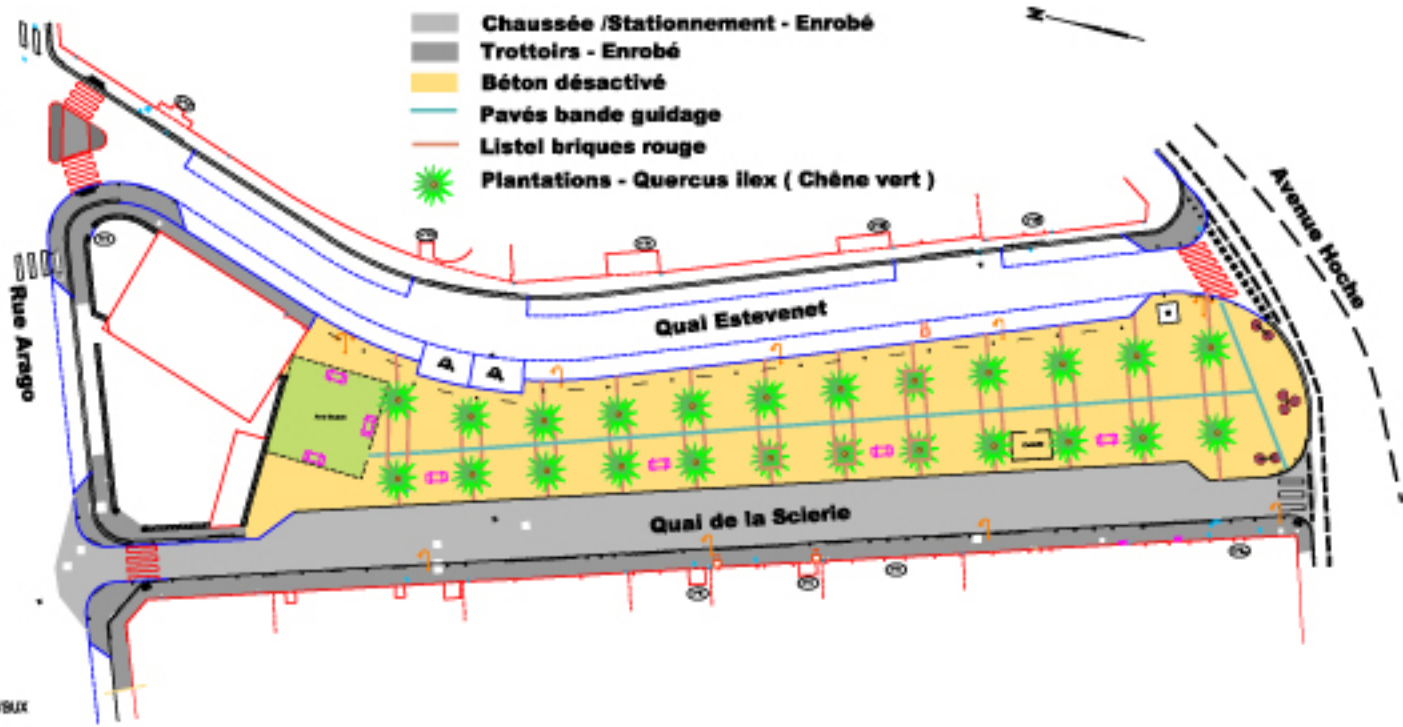

Quai Estevenet côté Ouest : stationnement réglementé à l'avancement des travaux

Quai de la Scierie : stationnement et circulation interdit.

L'accès des riverains sera préservé .
